株式会社サンモニター 御中

WEBサイトリニューアル
プロジェクトの進め方ガイド

進め方編・ダッシュボード編・移行計画編の3部構成　／　2026年10月16日

株式会社インフォネット
〒105-0004 東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル7F
制作・保守運用パートナー：株式会社ITLINE

© infoNet inc.All Rights Reserved.
CONFIDENTIAL

Contents

第1部　進め方編（スケジュール・役割分担）

04　プロジェクト運営の基本方針／メール・お電話＋Webダッシュボード

06　全体スケジュール／工程別の進捗表

08　貴社にお願いする事項／製品一覧のご記入／原稿・素材のご用意

11　Webサーバーのご契約（貴社名義）／情報共有・進捗管理の運用ルール

第2部　進捗ダッシュボード編（画面のご紹介）

14　専用ダッシュボードの全体像／画面のみどころ①〜③

18　ご利用方法（追加費用なし）

第3部　移行計画編（現行サイトからの移行）

20　移行の基本方針と対象

21　移行の5ステップ／リスクと対策

23　現行環境の調査結果と役割分担

© infoNet inc. All Rights Reserved.　CONFIDENTIAL

PART 1

進め方編

全体スケジュール・役割分担・お願いする事項・Webサーバーのご契約

POLICY

プロジェクト運営の基本方針

Web運用がほぼ1名体制であることを前提に、進行管理と専門領域は弊社側で担う体制を組んでいます。

進行管理は弊社が担当

各工程の段取り・スケジュール管理・品質管理は弊社が実施し、「次に行うこと」は毎回弊社からご案内します。貴社側での進行管理業務は発生しません。

貴社のご対応範囲を限定しています

貴社にお願いする事項は、①製品一覧へのご記入、②各工程の節目でのご確認・ご承認、③Webサーバー（貴社名義）のご契約、の3点に限定しています。制作・技術作業はすべて弊社が担当します。

ご質問・ご相談は随時受付

やりとりはメール・お電話を基本とし、Teams等ご希望のツールにも対応します。ご不明点は随時お寄せいただければ、定例を待たずに弊社が回答します。ご判断に必要な比較資料は毎回弊社がご用意します。

本書は「いつ・どちらが・何を行うか」を整理した進行ガイドです。次ページ以降で順にご説明します。

© infoNet inc. All Rights Reserved.
CONFIDENTIAL

COMMUNICATION

やりとりはメール・お電話＋Webダッシュボードで

やりとりはメール・お電話が基本（Teams等にも対応）。進捗は専用のWebダッシュボードでいつでもご覧いただけます。

メール・お電話＝随時の連絡窓口

・ご質問・ご相談は随時メールでお寄せください。平日9:00～18:00に確認し、原則1営業日以内にご返答します

・至急のご相談はお電話で。その場で一次回答し、必要に応じて折り返します

・Teams・Chatwork等、貴社ご希望のツールがあればそちらに合わせます

・ファイルの受け渡しもメールで行えます（容量が大きい場合は弊社の受け渡し用URLをご案内します）

Webダッシュボード＝進捗がひと目で分かる

・各工程の状況（完了／進行中／これから）を、見たいときにいつでもご確認いただけます

・「いまご対応をお願いしている事項」が期日つきで一覧になり、何を待たれているのか迷いません

・画面をそのまま印刷・共有して、社内でのご報告や関係者の皆さまへの情報共有にお使いいただけます

少人数の窓口ご担当者さまの調整業務を、弊社側の整理で軽くします。

依頼事項・確認事項・期日は弊社が整理してダッシュボードに掲載するため、貴社側で管理表を作成していただく必要はありません。


公開後のサポート窓口も同じメール・お電話に加え、更新依頼ダッシュボードをご利用いただけます（別紙「ご連絡方法と更新代行のご案内」）。

© infoNet inc. All Rights Reserved.
CONFIDENTIAL

SCHEDULE

全体スケジュール（2026年12月～2027年5月）

2026年12月のキックオフから2027年5月の公開まで、製品一覧のご記入期間を早期に確保した約6ヶ月の工程です。帯の色＝おもに動く側（紺＝弊社、オレンジ＝貴社にもご協力いただく期間）です。

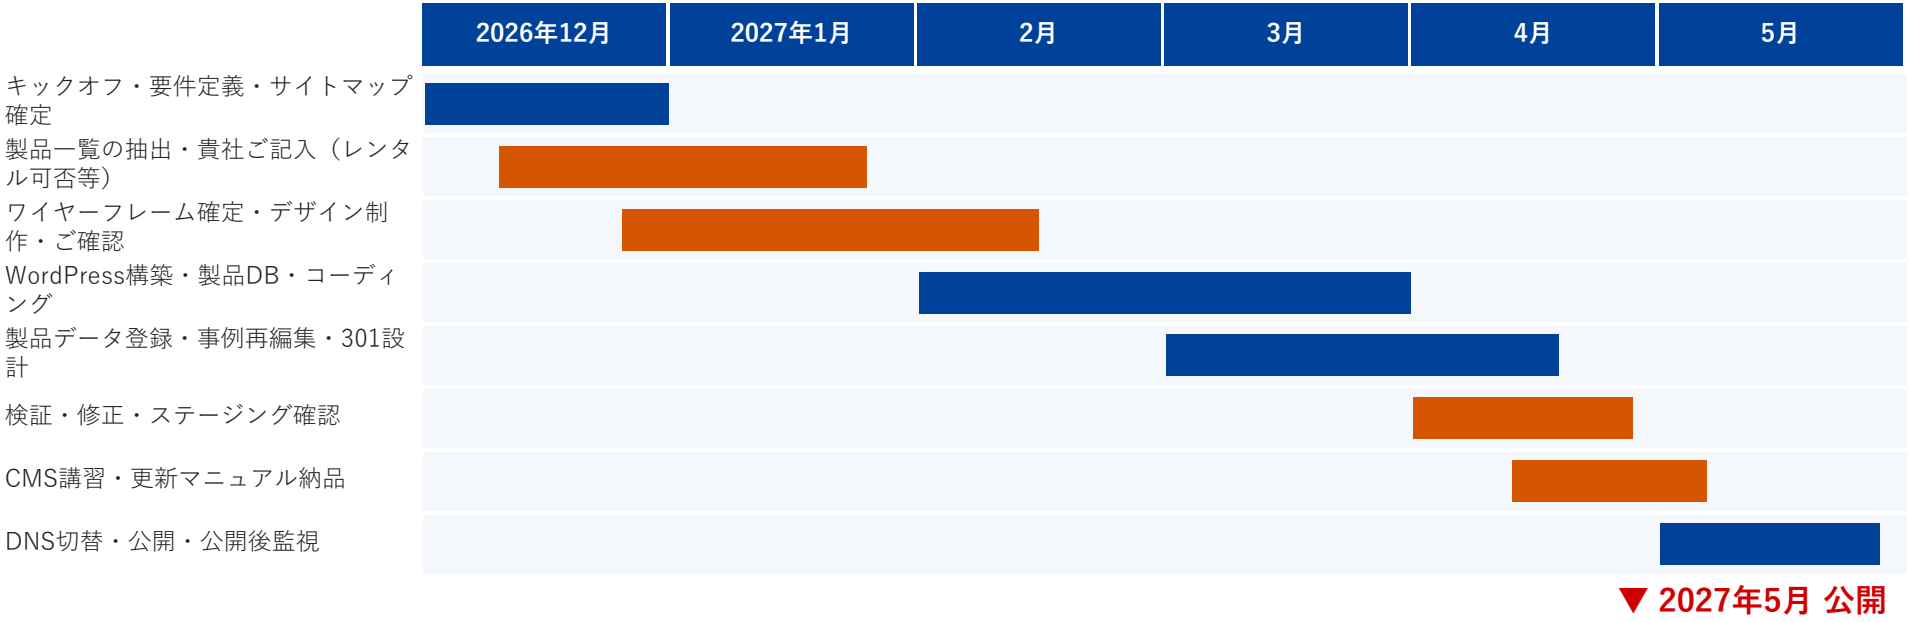

凡例｜紺＝弊社が作業する工程　オレンジ＝貴社のご記入・ご確認・ご参加をいただく工程

※ 詳細スケジュールはキックオフ時に確定版をお渡しし、隔週の定例で更新します。選定結果のご通知時期に応じて工程は前後します。

© infoNet inc. All Rights Reserved.
CONFIDENTIAL

PROGRESS TABLE

工程別の進捗表（どちらが・何を・いつ）

各工程で「弊社が行うこと」「貴社にお願いすること」を分けて一覧にしました。進捗ダッシュボードの工程と同じ8工程です。

#	工程（時期）	弊社が行うこと	貴社にお願いすること
1	**キックオフ・要件定義（12月）**	進め方・体制・連絡方法のご説明、要件定義、サイトマップ（固定27ページ＋製品DB）の確定	キックオフ会議へのご出席（1〜2時間）、サイトマップのご確認・ご承認
2	**製品一覧の抽出・ご記入（12〜1月）**	現行サイトから約85製品の一覧（Excel）を抽出し、記入欄を整えてお渡し	レンタル可否・販売可否・用途のご記入（分かる範囲から）
3	**WF確定・デザイン制作（1〜2月）**	主要ページのワイヤーフレーム確定、トップ・下層デザインの制作、修正対応	デザインのご確認・ご承認（修正2回まで）
4	**WordPress構築・製品DB（2〜3月）**	WordPress構築、製品データベースと絞り込み検索の実装、全ページのコーディング	Webサーバー（貴社名義）のご契約と管理権限の付与
5	**データ登録・事例再編集・301設計（3〜4月）**	ご記入いただいた一覧のCSV一括登録、現行の検査事例の「導入事例」への再編集、約340URLの301対応表の作成	製品写真の不足分のご提供（現行サイト画像の流用可）、事例内容のご確認
6	**検証・ステージング確認（4月）**	全ページの表示・動作・フォーム送信の検証、ステージング環境でのご確認依頼	ステージング環境でのご確認、検収のご承認
7	**CMS講習・マニュアル納品（4〜5月）**	オンラインでのCMS講習、画面キャプチャ付きPDFマニュアルの納品	講習へのご参加（更新を担当される方）
8	**DNS切替・公開・監視（5月）**	切替手順・切戻し手順の共有、公開作業、公開後の監視（表示・404・フォーム）	切替日時のご承認、現行の保守委託先の制作会社様へのDNS切替のご協力依頼

※「お願いすること」はいずれもご記入・ご確認・ご出席・ご契約手続きです。制作作業・技術的な作業は発生しません。

※ 各工程の進捗状況は、進捗ダッシュボードでいつでもご確認いただけます（次の定例を待つ必要はありません）。

© infoNet inc. All Rights Reserved.

CONFIDENTIAL

YOUR PART

貴社にお願いする事項（3項目）

貴社にお願いする事項は次の3項目です（お手元の写真・資料のご提供を含みます）。それ以外は弊社が実施します。

1

製品一覧への「ご記入」

弊社が現行サイトから抽出した約85製品の一覧（Excel）に、レンタル可否・販売可否・用途をご記入ください。弊社の抽出一覧を土台にするため、一から作成いただく必要はありません。ご記入後は弊社がCSVで一括登録します（詳細は次ページ）。

2

節目での「ご確認・ご承認」

サイトマップ・デザイン・導入事例の再編集内容・ステージング環境の各節目で内容をご確認いただき、「これで進めてよい」のご承認をいただきます。判断に迷わないよう、毎回比較材料と推奨案を添えてご提示します。ご承認はメールのご返信で完結できます。

3

Webサーバーの「ご契約」（貴社名義）

新しいWebサーバーは貴社名義でご契約いただきます（推奨環境：PHP 8.x／WAF／日次バックアップ／ステージング）。弊社が推奨プランとお申し込み手順をご案内し、ご契約後に必要な管理権限を制作側へ付与いただきます（本書P11）。

DNS切替と現行データの取り出しは、貴社から現行の保守委託先の制作会社様へご協力をご依頼いただく予定です（依頼内容と手順は弊社がご用意します）。

© infoNet inc. All Rights Reserved.
CONFIDENTIAL

PRODUCT LIST

製品一覧のご記入について（製品データベースの土台）

弊社の抽出一覧を土台に製品一覧を整備します。ご記入いただく項目はレンタル可否・販売可否・用途などに絞ります。

一覧の作成	弊社が現行サイトから約85製品を抽出し、製品名・型番・カテゴリ・現行ページURLを記入済みのExcelをお渡しします（12月）
ご記入いただく項目	レンタル可否・販売可否・中古の有無・主な用途（食品工場の異物混入対策／手荷物検査・警備／アパレルの検針等）・対応業界
ご記入の進め方	分かる範囲から順にご記入ください。不明な項目は空欄のままで結構です（弊社から確認します）。目安：12月〜1月
製品写真	社内撮影・現行サイト掲載・メーカー提供のいずれかをご提供ください。不足分は現行サイトの画像を流用できます
登録作業	ご記入いただいた一覧を弊社がCSVで一括登録し、製品一覧・絞り込み検索・関連ページへ自動反映します（3〜4月）

貴社にお願いしたいこと

・一覧へのご記入（12月〜1月）　・製品写真の不足分のご提供（現行サイト画像の流用可）

※ 公開後に製品を追加・変更される際も、同じ項目を管理画面またはCSVから登録できます（別紙「ご連絡方法と更新代行のご案内」）。

© infoNet inc. All Rights Reserved.
CONFIDENTIAL

CONTENTS PREP

原稿・素材のご用意について

既存ページ・検査事例の再構成は弊社が行います。貴社には、現行から変更のある情報と不足する素材のご提供をお願いします。

弊社が行うこと（ご用意不要）

・現行の固定ページを新しい27ページの構成へ再編成（文章・画像の整理）

・現行「新着情報」の検査事例を「導入事例」として再編集

（お客様名は伏せ、業種・異物・使用機器・結果で構成）

・製品ページを製品データベースから自動生成

・FAQ・技術サポートページの構成設計と既存情報の整理

・移行時の表示崩れの修正

ご提供をお願いするもの

・会社案内：会社概要・沿革など、現行から変更がある場合の最新情報

・FAQ：お電話でよくいただくご質問のメモ（箇条書きで可）

・導入事例：新しい検査事例があれば、写真と短いメモ

・製品写真の不足分（現行サイト画像の流用可）

・レンタルの流れ・サポート内容に変更があれば、その内容

既存コンテンツの再構成・再編集は弊社が担当します。新規原稿の執筆と写真撮影は本プロジェクトに含まれておりません。

進め方｜工程3（1月〜）の始めに「ご提供いただきたいものリスト」をお渡しし、進捗ダッシュボードの「ご対応をお願いしたいこと」に期日とあわせて掲載します。ファイルはメールでお送りいただけます。

新規に執筆が必要な原稿（技術コラム等）をご希望の場合は、コンテンツ企画支援として別途お見積りのうえ承ります（希望制）。

© infoNet inc. All Rights Reserved.

CONFIDENTIAL

SERVER

Webサーバーのご契約について（貴社名義）

Webサーバーは貴社名義でご契約いただきます。推奨環境とお申し込み手順は弊社がご案内します。

STEP1　推奨環境のご案内	STEP2　プランのお申込み	STEP3　管理権限の付与	STEP4　構築開始
12月（キックオフ時）	1月〜2月上旬	お申し込み後すぐ	2月〜

推奨環境（WordPressが安定稼働する条件）

- PHP 8.x が選択できること
- WAF（Webアプリケーションファイアウォール）
- 日次バックアップ
- ステージング環境（公開前の確認用）
- SFTP／SSHでの接続

貴社名義とする理由・メールの扱い

- サーバー契約を貴社名義とすることで、将来制作会社が変わる場合も円滑に運用を続けられます
- メールはMicrosoft 365のため移行は発生しません。Webサーバーのみ新環境へ移します
- サーバー利用料・ドメイン更新費は貴社のご契約に基づきます

お申し込みは貴社で行っていただき、必要な管理権限を制作側へ付与いただきます。プランの選定と手順は弊社がご案内します。

© infoNet inc. All Rights Reserved.
CONFIDENTIAL

VISIBILITY

情報共有・進捗管理の運用ルール

メール・お電話、進捗ダッシュボード、隔週の定例打合せの3つを組み合わせて、情報共有と進捗管理を運用します。

メール・お電話：随時の連絡・共有

ご質問・ご相談・ファイルの受け渡しはメールで随時行います（至急のご相談はお電話で）。平日9:00〜18:00に確認し、原則1営業日以内にご返答します。Teams等ご希望のツールにも対応します。

進捗ダッシュボード：進捗の可視化

本書P6・P7の工程表と連動し、各作業の状況（完了／進行中／これから）と貴社にお願いしたい事項を常に最新の状態に更新します。社内でのご報告資料としてもそのままご利用いただけます。

隔週の定例打合せと議事録

隔週の定例打合せ（オンライン可）で進捗と次の2週間の予定をご報告し、決定事項は議事録として速やかに共有します。ご出席は窓口のご担当者さまお一人で結構です。

公開後のサポートも同じ窓口（お電話・メール・更新依頼ダッシュボード）で継続します。プロジェクトと同じ体制のまま、運用フェーズへ移行します。

© infoNet inc. All Rights Reserved.
CONFIDENTIAL

PART 2

進捗ダッシュボード編

貴社専用に開発する進捗ダッシュボードの画面と使い方をご紹介します

▶ 動く画面イメージ（サンプルデータ）は、こちらからご覧いただけます

サンモニター様 進捗ダッシュボード（デモページを開く）


https://itline-kodama.github.io/share-35k6icl3a4iwfl/d.html

QRコードからも

OVERVIEW

サンモニター様専用の進捗ダッシュボード

ブラウザで専用URLを開くと、プロジェクトの「いま」がすべて分かる画面です。貴社専用に開発してご提供します。

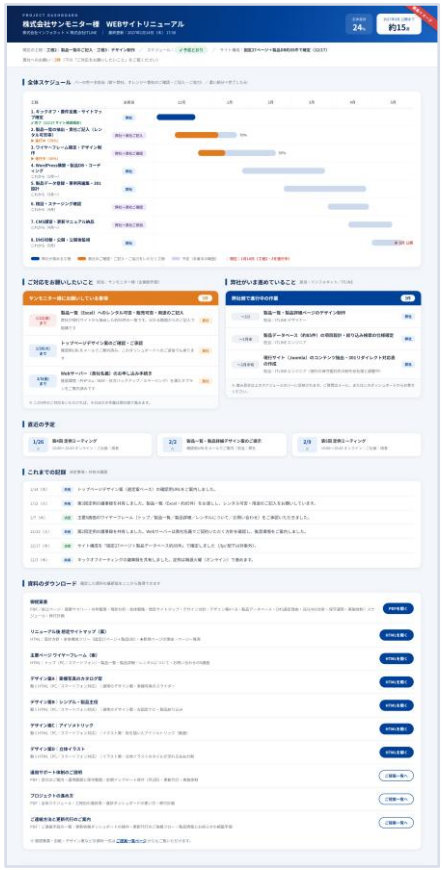

状況確認の手間を削減

現在の工程・進捗・ご確認事項を、お問い合わせいただくことなく画面上でご確認いただけます。最終更新日時を明記し、常に最新の状態を保ちます。

社内への共有がスムーズ

専用URL＋パスワードにより、ご担当者さまに加えて関係者の皆さまも同じ画面を参照でき、進捗の認識を統一できます。画面の印刷で社内のご報告にもお使いいただけます。

更新依頼もダッシュボードから

公開後の更新のご依頼とやり取りは、専用の更新依頼ダッシュボードから行えます。メール・お電話・貴社ご希望のツールと併用いただけます。

画面は左のとおり1ページ完結の構成。マニュアルを参照することなく、直感的にご確認いただけます。

© infoNet inc. All Rights Reserved.
CONFIDENTIAL

SCREEN 1

画面のみどころ①　ガントチャートで全体を把握

画面の中心はガントチャート。「どの工程を・誰が担当し・どこまで進んだか」が、この1枚に集約されています。



▲ 全体スケジュール（ガントチャート）：工程×月のバー＋主担当＋進捗率（サンプル：2027年1月14日時点）

ここが便利

・バーの色で担当がひと目：紺＝弊社が進める工程、オレンジ＝貴社のご記入・ご確認・ご参加をいただく工程

・バーの濃い部分＝完了した分。「いまどこまで来たか」が塗りの長さで直感的に分かります（例：製品一覧のご記入 70%）

・各工程の左に状況（完了／進行中／これから）を明記。会議資料にそのまま使えます

© infoNet inc. All Rights Reserved.
CONFIDENTIAL

SCREEN 2

画面のみどころ②　対応主体と期限の明確化

ご対応をお願いしている事項と、弊社側で進行中の作業を分けて表示します。対応主体と期限が常に明確になります。



▲ サンモニター様にお願いしている事項（期限つき・担当バッジ）



▲ 弊社側で進行中の作業（期限・担当者つき）

ここが便利

・オレンジ＝貴社のご対応事項、紺＝弊社の作業。対応主体が色とバッジで判別できます

・貴社へのご依頼は期限つきで必要最小限に絞り（例：製品一覧のご記入・デザイン案のご確認・サーバーのお申し込み）、ご対応後は一覧から消えるため見落としを防げます

・弊社側の作業も担当者（デザイナー／エンジニア）まで開示。進み具合は上のガントチャートに反映されます

© infoNet inc. All Rights Reserved.
CONFIDENTIAL

SCREEN 3

画面のみどころ③　直近の予定と、これまでの記録

「次に何があるか」と「これまでに何が決まったか」も、同じ画面で確認できます。



▲ 直近の予定（担当つき）：隔週の定例ミーティングとご提示物の予定が並びます

ここが便利

・直近の予定には担当（弊社／両者）を明記。定例やご提示物の予定が並び、日程の見通しが立ちます

・「決定」「共有」のタグつきで履歴（これまでの記録）が残るため、会議に出ていない方や途中参加の方への説明がスムーズです

・サイト構成の確定・デザインのご承認などの節目がすべて記録され、あとから「言った・言わない」になりません

これまでの記録（サンプルデータの例）

1/7（木）　決定｜主要5画面のワイヤーフレーム（トップ／製品一覧／製品詳細／レンタルについて／お問い合わせ）をご承認いただきました。

12/22（火）　共有｜第2回定例の議事録を共有しました。Webサーバーは貴社名義でご契約いただく方針を確認し、推奨環境をご案内しました。

12/17（木）　決定｜サイト構成を「固定27ページ＋製品データベース約85件」で確定しました（/lp/ 配下は対象外）。

資料のダウンロード欄から、確定した資料の最新版（御提案書・サイトマップ・デザイン案など）も取得できます。

© infoNet inc. All Rights Reserved.　CONFIDENTIAL

HOW TO USE

ご利用方法（追加費用なし）

アプリのインストールは不要。パソコン・タブレット・スマートフォンのブラウザで専用URLを開いてご覧いただけます。

ブラウザで専用URLを開く

貴社専用のURLとパスワードをお渡しします。ブックマークしておけば、いつでも1クリックで最新の状況をご覧いただけます。

スマートフォン対応

画面はスマートフォンでも見やすく最適化。外出先や客先への移動中でも進捗を確認できます（右の画面イメージ）。

更新は弊社が実施

定例・作業の節目ごとに弊社が更新します（最終更新日時を明記）。貴社側で入力・操作していただくことはありません。

追加費用はありません

ダッシュボードの開発・運用はプロジェクト費用に含めてご提供します。公開後の保守期間中も継続します。



▲ スマートフォン表示

▶ 動く画面イメージ（サンプルデータ）：https://itline-kodama.github.io/share-35k6icl3a4iwfl/d.html

本資料の画面はサンプルデータによる開発イメージです。キックオフ時に、貴社の実データで運用を開始します。

© infoNet inc. All Rights Reserved.
CONFIDENTIAL

PART 3

移行計画編

現行サイト（Joomla）からの移行方針・工程・リスク対策（現行環境の調査は完了済み）

MIGRATION POLICY

移行の基本方針と対象

現行サイト（Joomla＋WordPress /news/）を止めることなく、2027年5月の切り替えを計画どおりに進めます。

安全第一

現行サイトは公開したまま新環境を並行構築。切替はDNSの向き先変更で、旧環境を一定期間温存し即時に切り戻せる体制とします。

製品はデータベースへ

手組みの製品ページ約85件を製品データベースへ登録。カテゴリ・用途・レンタル可否で絞り込める構造に移し替えます。

検証優先

公開前にステージング環境で全ページの表示・リンク・フォーム動作を検証し、ご確認完了後にのみ切替を実施します。

移行対象	規模・方針	移行方法
固定ページ	27ページ	現行約300ページを整理・統廃合し、新サイトの共通テンプレートへ再構成（/lp/ 配下は対象外）
製品情報	約85製品	弊社が抽出した一覧に貴社がレンタル可否・用途等をご記入 → CSVで製品データベースへ一括登録
導入事例	現行の検査事例	現行「新着情報」の異物検査事例を「導入事例」として再編集（お客様名は伏せ、業種・異物・使用機器・結果で構成）
お知らせ	要件定義で確定	移行範囲（過去記事の扱い）はキックオフ時の要件定義で確定します
フォーム	7種 → 3種	現行のカテゴリ別フォーム7種を、お問い合わせ／見積依頼／資料請求の3フォームに整理し、自動返信を含め再構築
旧URL	約340URL	旧URL→新URLの301リダイレクトを全件設計し、検索評価とブックマークを引き継ぎ
ドメイン・メール	sunmonitor.co.jp	現行ドメインを継続利用。メールはMicrosoft 365のため移行なし（Webサーバーのみ貴社名義の新環境へ）

© infoNet inc. All Rights Reserved.
CONFIDENTIAL

MIGRATION PHASES

移行の5ステップ（どちらが・何を）

移行は5つのステップで管理します（御提案書P20と同じ構成）。現行データの取り出しとDNS切替は、現行の保守委託先の制作会社様のご協力を得て進めます。

#	ステップ（時期）	弊社が行うこと	貴社にお願いすること
1	**現行データの取り出し（12月）**	取り出し項目（固定ページ・製品ページ・新着情報・画像）の整理／現行の保守委託先の制作会社様への依頼内容と手順書の作成／全ページ照合リスト（331ページ＋フォーム9件）の確定	現行の保守委託先の制作会社様へのご協力依頼（依頼文は弊社がご用意します）
2	**製品一覧の抽出・ご記入（12〜1月）**	現行サイトから約85製品を抽出し、記入欄付きのExcel一覧を作成／ご記入内容の確認と項目表記の整形	レンタル可否・販売可否・用途のご記入／製品写真の不足分のご提供
3	**DB登録・301対応表（3〜4月）**	一覧のCSV一括登録と製品ページの自動生成／導入事例の再編集／約340URLの301リダイレクト対応表の作成／フォーム3種の再構築	製品ページ・導入事例の内容のご確認
4	**ステージング検証（4月）**	検証環境で全ページの表示・リンク・フォーム送信・自動返信を試験／スマートフォン表示の確認／旧→新URLの転送テスト	検証環境での内容のご確認（確認用URLを発行します）／検収のご承認
5	**DNS切替・公開後監視（5月）**	切替手順書・切戻し手順の事前共有／SSL証明書の事前発行／アクセスの少ない日時に切替し当日の疎通確認／公開後の表示・404・フォーム監視	切替日時のご承認／現行の保守委託先の制作会社様へのDNS切替のご依頼（手順書は弊社がご用意します）

公開はアクセスの少ない日時に実施し、旧環境を一定期間温存。切替手順と切戻し手順を事前に共有します。

© infoNet inc. All Rights Reserved.
CONFIDENTIAL

RISK MANAGEMENT

移行のリスクと対策

想定されるリスクには、あらかじめ対策を用意したうえで着手します。

想定リスク	対策
現行データを取り出せない・対応範囲が限られる	現行の保守委託先の制作会社様へ、貴社から取り出しのご協力を依頼いただく予定です。対応範囲が限られる場合も、公開中のサイトから弊社が取得する方法で補完できます（2025年10月に全331ページのクロールを実施済み）
Joomla独自の構造による表示崩れ	取り出したデータを新テンプレート用に一括変換（不要タグの除去・見出し／表・内部リンクの正規化）したうえで登録し、全ページを目視で照合します
製品情報の抜け漏れ・項目のばらつき	弊社の抽出一覧と貴社のご記入内容を突き合わせ、CSV登録前に項目の表記（カテゴリ・用途・レンタル可否）を統一します
移行漏れ・ページの欠落	全ページ照合リストで新旧サイトを1ページずつ突き合わせ、公開前に全件検収します
DNS切替の失敗・切替後の不具合	切戻し手順を事前共有し、旧環境を一定期間温存。万一の際はDNSを戻して旧サイトへ即時復旧できます
検索順位・被リンクの毀損	旧URL→新URLの301リダイレクトを約340URL分設計し、検索評価（平均掲載順位1.96位のページを含む）とブックマークの引き継ぎを図ります。公開後は404を監視して追加対応します

リニューアルにより、現行環境のリスク（サポートが終了した旧バージョン等）も解消します。

© infoNet inc. All Rights Reserved.
CONFIDENTIAL

ENVIRONMENT & ROLES

現行環境の調査結果と役割分担

現行環境は2025年10月のクロールと2026年9月の簡易セキュリティ診断で把握済みです。移行の役割分担は以下のとおりです。

項目	調査結果
現行CMS	Joomla（T3テンプレート）にWordPress（/news/）を内包。PHP 5.6.33
規模	331ページ＋フォーム9件（2025年10月クロール）。製品ページは1製品1ページの手組み
フォーム	カテゴリ別フォーム7種。新サイトでは3種（お問い合わせ／見積依頼／資料請求）に整理
製品情報	Excelと製品写真で管理（管理用の一覧なし）。弊社の抽出一覧を土台に整備
サーバー	現行の保守委託先の制作会社様が管理。新環境は貴社名義でご契約
メール・DNS	メールはMicrosoft 365（移行なし）。DNS切替は現行の保守委託先の制作会社様へ協力依頼

担当	役割
インフォネット	プロジェクト統括・お客様窓口／要件定義・品質管理／現行の保守委託先の制作会社様への依頼内容の整理
ITLINE	データの取り出し・変換・登録の実務／製品DBと新環境の構築・検証／301設計／切替手順書の作成と当日の立会い
サンモニター様	製品一覧へのご記入／検証環境のご確認／切替日時のご承認／現行の保守委託先の制作会社様へのご協力依頼
現行の保守委託先の制作会社様	現行データの取り出しとDNS切替のご協力（貴社からご依頼・対応範囲は貴社経由で確認予定）

現行環境の調査は完了しており、移行の不確実性を抑えた状態でプロジェクトを開始できます。

© infoNet inc. All Rights Reserved.
CONFIDENTIAL
